

# Diaľnica D3

Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR



NÁRODNÁ  
DIAĽNIČNÁ  
SPOLOČNOSŤ

Oddelenie investičnej prípravy diaľnic  
Ing. Tomáš Pollák  
vedúci oddelenia

23.09.2015  
Poľská republika



# D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

## Stavebné úseky D3

ZA, Strážov – ZA, Brodno


ZA, Brodno – K. N. Mesto

K. N. Mesto – Oščadnica

Oščadnica – Čadca, Bukov

Čadca, Bukov – Svrčinovec

Svrčinovec - št.hr. SR/PR

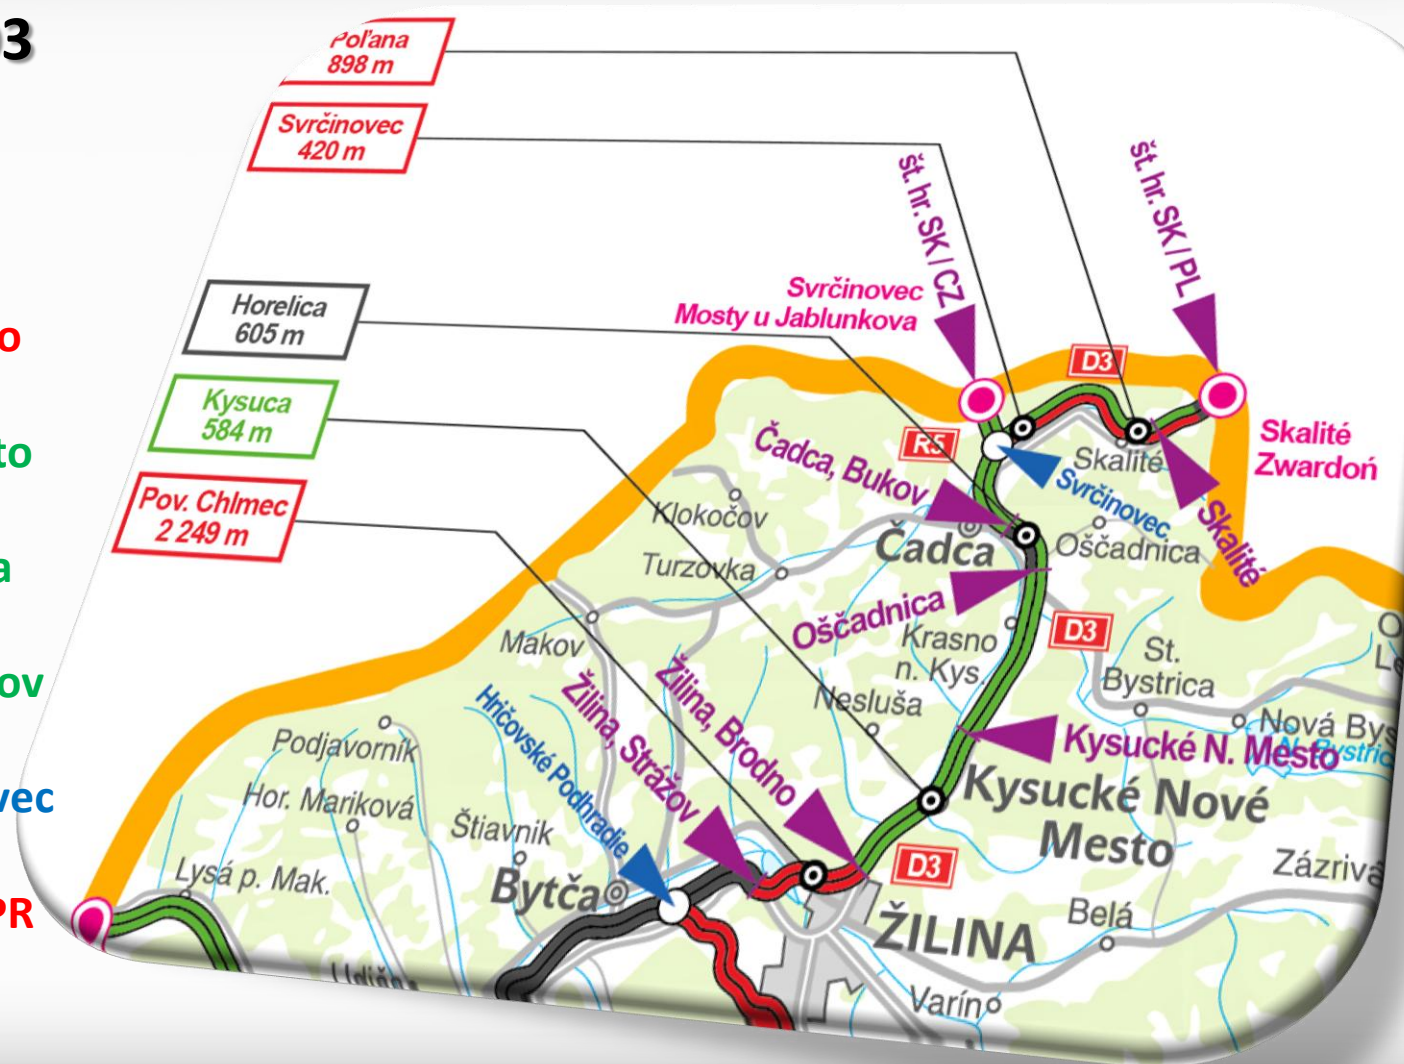



# D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

## 1.úsek: **Žilina, Strážov – Žilina, Brodno**

Začiatok výstavby: **30.06.2014**

Ukončenie výstavby: **28.06.2017**

Zmluvná cena: **254 899 999,90 EUR** bez DPH

Fakturované k 31.08.2015: **69 395 657 EUR** bez DPH






# D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

## 2.úsek: **Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto**

Plánovaný začiatok výstavby: 06/2022

**Aktuálne analýza technického riešenia podľa Štúdie realizovateľnosti**

- vypustenie tunela Kysuca zmenou nivelety na mostnú estakádu

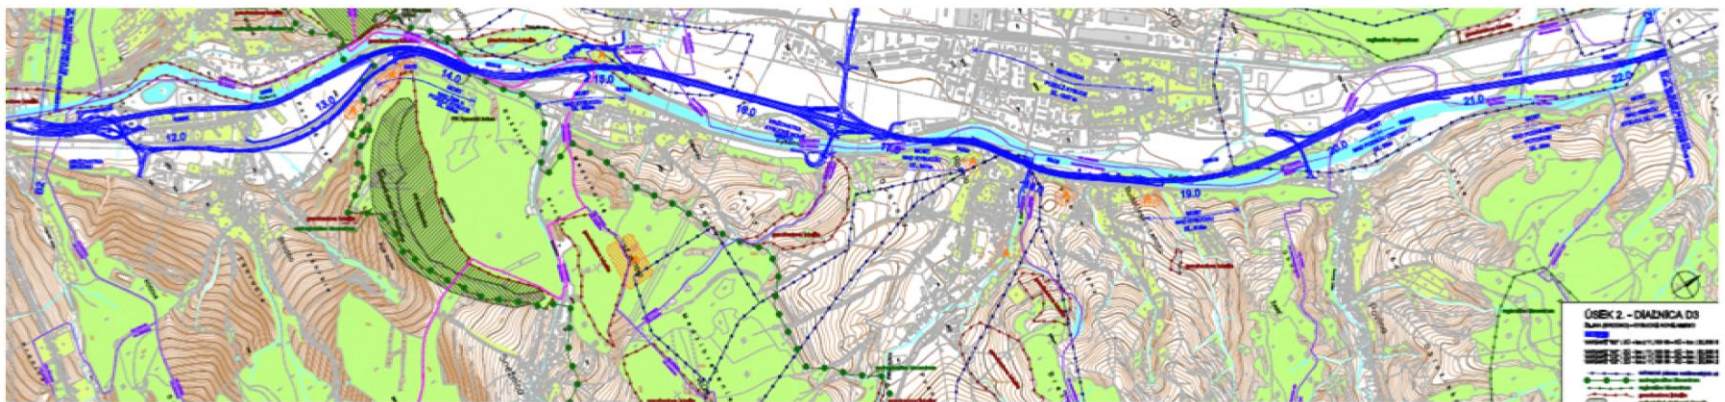



## 3.úsek: **Kysucké Nové Mesto- Oščadnica**

Plánovaný začiatok výstavby: 09/2019

**Aktuálne analýza technického riešenia podľa DSP a Štúdie realizovateľnosti**

- využiteľnosť cesty I/11 pre plný profil diaľnice
- zmenou technického riešenia je možné ušetriť cca 26 % stavebných nákladov





# D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

## 4.úsek: Oščadnica – Čadca, Bukov, 2/2 profil

Plánovaný začiatok výstavby: 10/2018

Aktuálne tender na zhotoviteľa DSP, DP, 8a, AD a KD (dodanie DSP 10/2016)





# D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

## 5.úsek: Čadca, Bukov – Svrčinovec

Stavebné povolenie: 31.10.2015

Plánovaný začiatok výstavby: 01/2016

**Aktuálne tender na zhotoviteľa stavby**





## D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

### 6.úsek: **Svrčinovec – štátna hranica SR/PR**

Začiatok výstavby: **25.10.2013**

Ukončenie výstavby: **24.10.2016**



Zmluvná cena: **329 879 543 EUR** bez DPH

Fakturované k 31.08.2015: **160 256 381 EUR** bez DPH





# D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

## 6.úsek: **Svrčinovec – štátna hranica SR/PR**



D3 SVRČINOVEC - SKALITÉ SO 243

foto: J. MRAVEC 19.8.2015



## D3 Žilina, Strážov – št. hranica SR/PR

Stavba	Dĺžka [km]	Začiatok výstavby	Ukončenie výstavby	Stavebný náklad
Žilina, Strážov – Žilina, Brodno	4,25	06/2014	06/2017	*254 899 999 €
Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto	11,20	06/2022	06/2025	380 928 000 €
Kysucké Nové Mesto - Oščadnica	10,72	09/2019	09/2022	200 000 000 €
Oščadnica - Čadca Bukov, (2/2. profil)	4,00	10/2018	09/2021	77 195 000 €
Čadca, Bukov - Svrčinovec	5,67	12/2015	01/2019	199 118 715 €
Svrčinovec – št. hr. SR/PR (1/2 profil)	15,41	10/2013	10/2016	*329 879 543 €



Ďakujem za pozornosť

tomas.pollak@ndsas.sk
